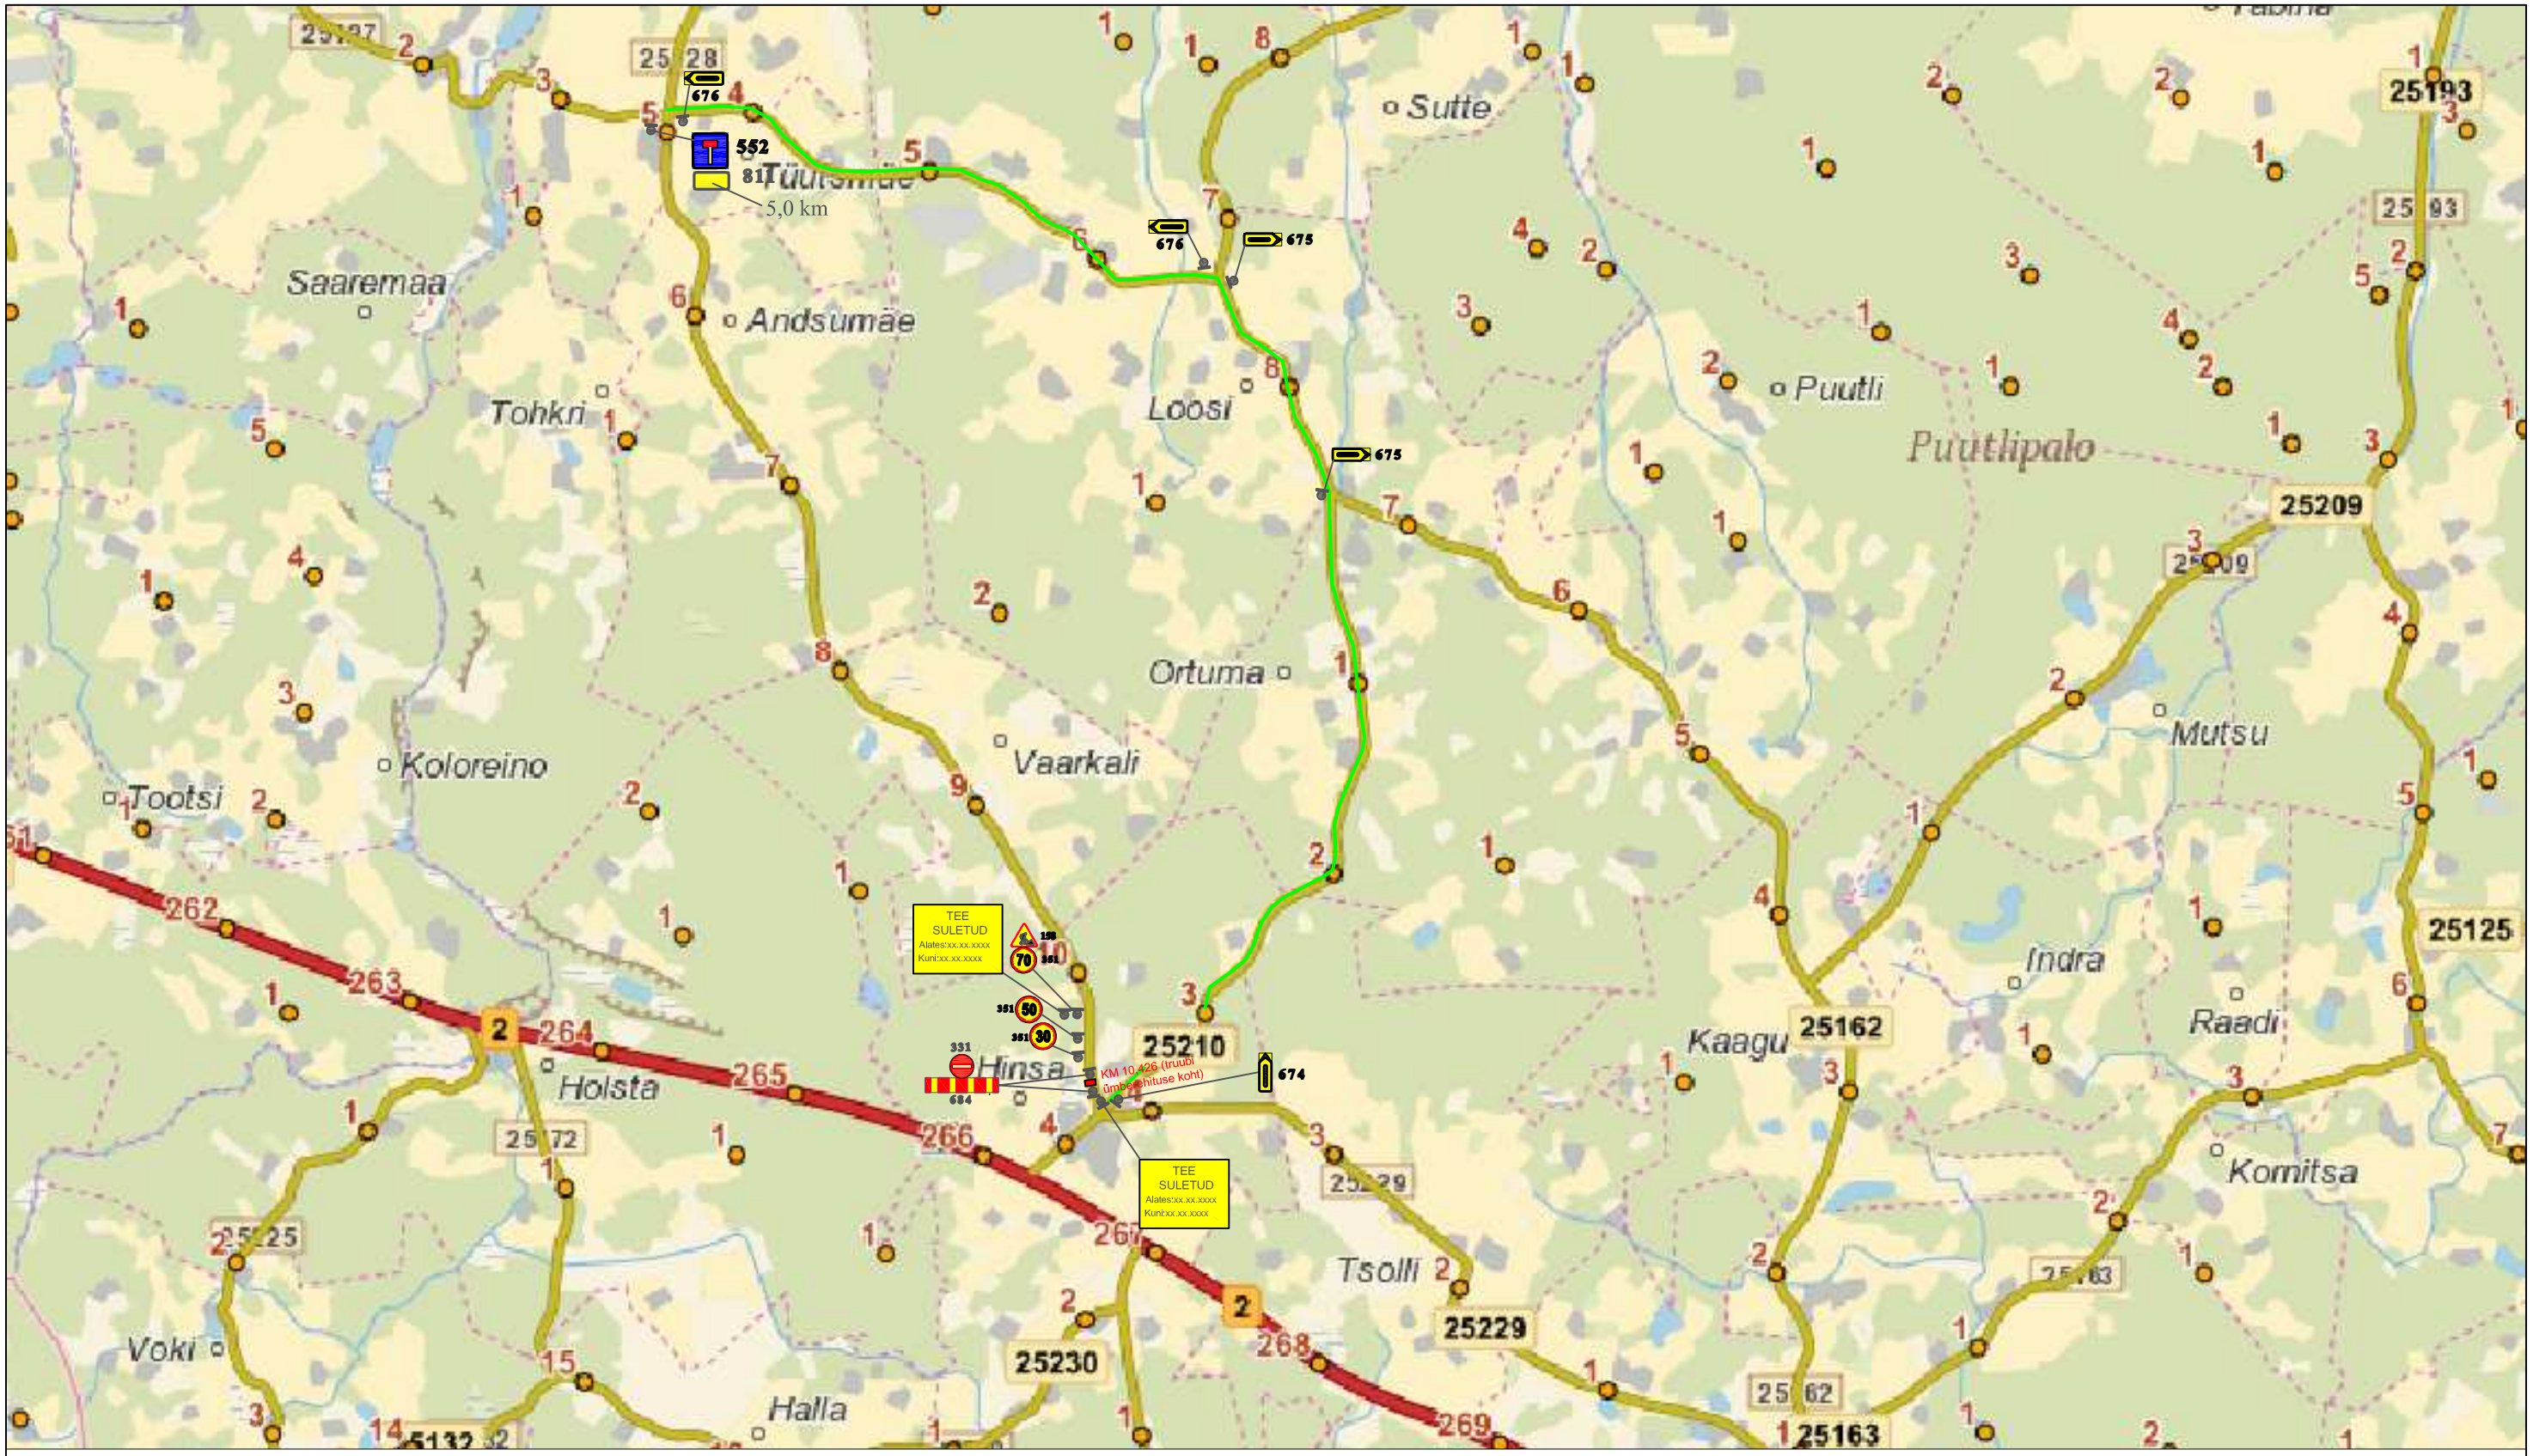

Märkused: 1. Töödest ja liikluspiirangutest teavitada Maanteeinfokeskust (teeinfo@mnt.ee)vähemalt **3 tööpäeva** enne tööde alustamist.

2. Teetöödel juhinduda Majandus-ja taristuministi 13.07.2018 määrusest nr 43"Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" ja Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 14.11.2018 nr 1-2/ 18/ 485 "Riigiteede ajutine liikluskorraldus" nõuetest.

3. Liiklusmärkide vahekaugused.
Lm 331. ja Lm 351. (30) - 25 m
Lm 351.(30) ja Lm 351. (50) - 100 m
Lm 351.(50) ja Lm 351. (70) - 150 m

4.Teabetahvel paigaldatakse 48 h enne tee sulgemist

5.Teabetahvli tähekõrgus on vähemalt 125 mm

LIIKLUSKORRALDUS TRUUBI (KM 10,426) ÜMBEREHITUSE AJAL			
Tööde teostamise koht:	Riigimaantee nr 25128Husari - Sooküla-Hinsa		
Koostas: A.Voitka	KUTSETUNNISTUS NR 129219 Isikukood 35411136511	E-post:ahtivoitka@gmail.com	
Töid teostab:	AS Eesti Teed Linnuse 6 44306 Rakvere	Toomas Keem 5212283	
Tööde algus:	21. oktoober 2020	*Tööde lõpp:*	21. oktoober 2020
